



Міністерство розвитку
громад та територій
України

UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



EURASIA
FOUNDATION

OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP



DREAM

РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ГРОМАД

Порядки підготовки, оцінки та реалізації
середньострокового плану пріоритетних
публічних інвестицій, публічних інвестиційних
проектів та програм

Загальний огляд

ЗМІСТ

Вступ	7
Скорочення та абревіатури	8
Передумови та етапи впровадження реформи УПІ	9
Графік впровадження реформи УПІ	14
Інституційне забезпечення	15
Розробка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій	17
Як підготувати публічний інвестиційний проект та програму	21
Оцінка публічних інвестиційних проектів та програм	29
Формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій і секторального проектного портфеля держави, регіону, громади	31
Реалізація публічних інвестиційних проектів та програм	37
Перелік основних нормативно-правових актів, що формують правову основу реформи управління публічними інвестиціями	38

Шановні представники громад!

Після початку повномасштабного вторгнення росії інфраструктура України зазнала небачених руйнувань. За даними оновленого звіту швидкої оцінки завданої шкоди RDNA4, потреби на відновлення України сягнули 524 мільярдів доларів.

Попри виснажливу війну і щоденну боротьбу за своє існування, Україна зберігає стійкість. Запорукою цієї стійкості є люди, які щодня боронять нашу державу, живуть і працюють у своїх містах та громадах, рятують, евакуюють, будують, відновлюють.

Але завдання держави полягає не просто у відновленні понівеченої інфраструктури, а перш за все у тому, щоб закласти нові стандарти управління ресурсами. Це дозволить втілити в життя принцип Build Back Better – відбувати краще, ніж було. Це не лише красива декларація, це системні зміни, завдяки яким відновлення відбувається з урахуванням реальних запитів та потреб, та включає обов'язкові стандарти енергоефективності, інклузивності, екологічності, безпеки. Для цього створюються умови задля посилення спроможності відновлення та розвитку громад. Перш за все, через запровадження новітніх механізмів управління проектами, стратегічного планування, використання фінансових та цифрових інструментів, які відповідають провідним світовим стандартам.

Уряд активно впроваджує реформу управління публічними інвестиціями, яка є однією з ключових для успішного, ефективного та підзвітного відновлення та розвитку України. Драйверами реформи є Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство економіки та Міністерство фінансів України. Реформу розроблено з урахуванням найкращого світового досвіду та світових практик, за підтримки міжнародних партнерів.



Реформа управління публічними інвестиціями поєднує стратегічне та середньострокове бюджетне планування. Такий підхід дозволяє ефективно спрямовувати фінансові ресурси держави на реалізацію найбільш важливих для суспільства проектів.

Важливо, що реалізація реформи відбувається із застосуванням цифрових інструментів. Це забезпечує прозорість і підзвітність, та дозволяє в режимі реального часу відстежувати всі процеси пов`язані з відбором, оцінкою та реалізацією публічних інвестиційних проектів.

Минулого року Стратегічна інвестиційна рада Кабміну затвердила Єдиний проектний портфель здійснення публічних інвестицій, до якого увійшли 789 проектів. 93 з них будуть частково або повністю профінансовані за кошти держбюджету у 2025 році. У фокусі об'єкти соціальної сфери, охорони здоров'я, водопостачання і водовідведення, відбудова житла, транспорт, захист енергооб'єктів.

Попри чорну, страшну війну, попри біль від втрат, ми зберігаємо людяність, прагнення подбати про майбутнє – залишити прийдешнім поколінням не лише матеріальну спадщину, але й системні підходи, які служитимуть дороговказом для розвитку та добробуту на багато років вперед.

Олексій КУЛЕБА

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України

Дорогі друзі!

Попри виснажливу війну, яку веде росія проти України, та виклики, з якими ми стикаємося щодня, нашою спільною метою є створення кращого майбутнього для нашої країни. Війна – це час для великих трансформацій. Тому ми не зупиняємося і продовжуємо процес впровадження

реформ в Україні. Вже зараз ми маємо заклади основи для розумного і сталого розвитку. Держава у співпраці з міжнародними партнерами, місцевою владою, експертами і громадськістю продовжує напрацьовувати стратегії розвитку на всіх рівнях з урахуванням викликів воєнного часу: соціальних, економічних, гуманітарних, логістичних.

Зокрема, протягом грудня 2024 року – січня 2025 року Міністерство розвитку ініціювало низку стратегічних сесій, які охопили всі регіони України, для проведення скринінгу регіональних стратегій.

Ці стратегічні плани створять єдину логічну взаємопов'язану систему, та визначать загальний вектор розвитку громад, регіонів, і країни.

Підготовка стратегій зараз – це інвестиція в те, щоб у майбутньому забезпечити якісне життя для кожного українця, а також мати чіткий план подолання наслідків війни.

Для того, аби більш ефективно керувати наявними ресурсами та залучати додаткові фінанси, Україна продовжує впроваджувати реформу управління публічними інвестиціями, що передбачає єдиний підхід до розподілу публічних коштів. Реформа є вкрай важливою для швидкого та ефективного відновлення і розвитку України та є критичною для залучення коштів міжнародних партнерів.

Як і будь-яка реформа, управління публічними інвестиціями потребує зрозумілої правової рамки із застосуванням сучасних фінансових механізмів та цифрових інструментів для послідовного руху вперед.



Під час попередніх етапів реалізації реформи було затверджено низку законодавчих та нормативних документів, які забезпечують чіткі механізми створення проектів та програм відповідно до визначених пріоритетів.

Розробка Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, підготовка проектів та програм, їх оцінка, формування секторальних проектних портфелів на місцевому, регіональному та національному рівнях, формування проектних портфелів громад та обласних військових адміністрацій, моніторинг реалізації та оцінка впливу здійснюються з використанням екосистеми DREAM. Екосистема DREAM, як частина Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, є ключовим цифровим інструментом, що лежить в основі реформування, та забезпечує прозорість та підзвітність усіх процесів. Завдяки цьому будь-хто в режимі реального часу може дізнатися про пріоритетні проекти в тій чи іншій громаді та відстежувати кожен етап їх впровадження.

Для того, аби допомогти громадам зрозуміти сутність і логіку реформи, а також краще підготуватися до оновлень, ми розпочинаємо масштабне навчання щодо підготовки і управління публічними інвестпроектами.

Протягом 2025 року буде завершено нормативне та методологічне забезпечення реформи. Це дозволить забезпечити повноцінний перехід на нову систему управління публічними коштами з наступного року.

Завдання держави – зробити відновлення максимально прозорим та підзвітним. Це дозволить найкращим чином використати бюджетні кошти, а також більш ефективно залучати міжнародні фінанси у відновлення і розвиток громад.

Попри всі труднощі, ми плануємо наше майбутнє. Ми прагнемо, щоб життя в Україні було комфортним та безпечним. Ця мета цілком досяжна, і всі разом докладаємо максимальних зусиль для її реалізації.

Олексій РЯБИКІН

Заступник міністра розвитку громад та територій України

ВСТУП

Цей матеріал розроблено командою Open Contracting Partnership та Проектного офісу DREAM у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансирується UK Dev.

Він призначений для голів громад, представників обласної влади, міністерств, фахівців секторальних структурних підрозділів, департаментів, уповноважених на реалізацію державної інвестиційної політики на місцевому рівні, фахівцям, які працюють з екосистемою DREAM.

Це – практичний інструмент, покликаний сформувати загальне уявлення про рамку реформи управління публічними інвестиціями, зрозуміти логіку реформи, ознайомитися з ключовими законодавчими змінами, зрозуміти особливості стратегічного планування, а також усвідомити, які першочергові кроки мають бути здійснені в рамках реформи на рівні громад та регіонів. А також, опанувати основні терміни, поняття та категорії, які визначає реформа.

Інформація викладена у зручній та доступній формі, і містить описову частину кожного етапу і покрокову послідовність підготовки, оцінки та пріоритезації інвестиційних проектів та програм, які потребують залучення публічних коштів для їх фінансування.

Реформа реалізується Урядом України за лідерства Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства економіки та Міністерства фінансів України.

Мінрозвитку є драйвером у впровадженні реформи на рівні громад задля підвищення їх спроможності й стійкості, створення умов для рівномірного розподілу ресурсів, забезпечення першочергових потреб, визначення пріоритетів відповідно до стратегій розвитку громад, областей та Державної стратегії регіонального розвитку. Екосистема DREAM є основним цифровим інструментом реформи управління публічними інвестиціями, як платформа, на якій будуть розміщені всі інвестиційні проєкти.

Команда Проектного офісу DREAM глибоко занурена у процес формування нової архітектури інвестиційної політики держави, тож за підтримки Мінрозвитку, експерти DREAM підготували цей посібник для того, аби допомогти всім стейкхолдерам підготуватися до майбутніх змін. Наразі також розробляються детальні методичні рекомендації для громад та комплексні програми інформування та навчання громад і регіонів щодо особливостей реформи. Тож слідкуйте за оновленнями від Мінрозвитку та команди DREAM – підготуємося та впровадимо реформу разом.

СКОРОЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ

УПІ – управління публічними інвестиціями

ЕПП – єдиний проектний портфель

СПІ – середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

ДСРР – Державна стратегія регіонального розвитку

ГРК – головний розпорядник коштів

ОМС – орган місцевого самоврядування

ОВА – обласна військова адміністрація

ОДА – обласна державна адміністрація

ПІП – публічний інвестиційний проект

ДПП – Державно-приватне партнерство

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ УПІ

Для початку визначимося в дефініціях.

Законодавство України (див. Додаток) визначає **публічні інвестиції** як кошти державного або місцевого бюджету, що спрямовуються на капітальні витрати центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств. Всі публічні інвестиції мають бути відображені у державному або місцевому бюджеті незалежно від джерел та механізмів фінансування.

Публічний інвестиційний проект (ПІП) – комплекс заходів на основі стратегічних документів спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, регіонів з використанням публічних інвестицій. ПІП, що мають спільну мету та потребують узгодженої реалізації, можуть бути об'єднані у програми публічних інвестицій, наприклад, укриття для закладів освіти чи розбудова мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

З публічних інвестиційних проектів та програм формуються **секторальні проектні портфелі** та **єдиний проектний портфель публічних інвестицій**.

Реформа управління публічними інвестиціями запроваджує єдиний уніфікований підхід до стратегічного планування, формування напрямів державного інвестування, розробки проектів та програм публічних інвестицій, формування секторальних і Єдиного проектного портфеля, оцінки та пріоритетизації проектів, моніторингу та контролю їх реалізації, включно з розподілом фінансування.

Для чого потрібні зміни?

Відповідно до звіту Європейської комісії, Світового банку та Кабінету Міністрів України про оцінку управління публічними інвестиціями, в Україні існувало понад 15 різних процедур для підготовки ПІПів та їх фінансування. Це не лише негативно впливало на ефективність та якість використання коштів, а й зменшувало довіру міжнародних партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Серед основних змін, які мала впровадити Україна, визначалися:

- ▼ Створення єдиної, підзвітної та стратегічно орієнтованої системи управління публічними інвестиціями
- ▼ Розробка та запровадження середньострокового інвестиційного планування
- ▼ Запровадження обов'язкового аналізу вартості та ефективності проектів
- ▼ Забезпечення прозорості фінансування та моніторингу інвестиційних проектів через єдину інформаційну систему
- ▼ Формування чітких критеріїв відбору інвестиційних проектів
- ▼ Розвиток кадрового потенціалу ОМС та ЦОВВ у сфері управління інвестиціями
- ▼ Створення єдиної бази даних проектів, що охоплюватиме їх повний життєвий цикл від оцінки до реалізації

Нові виклики та рішення

За даними звіту Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA4), з початку повномасштабного вторгнення росії, потреби на відновлення України перевищують 524 мільярди доларів США.

В умовах обмеженого ресурсу держави критично важливим є залучення фінансів міжнародних партнерів і донорів. Водночас відбудова країни потребує не лише відновлення втраченого, а й побудови нової моделі розвитку та модернізації інфраструктури.

Впровадження реформи управління публічними інвестиціями дозволить спрямовувати публічні кошти на пріоритетні проекти, що відповідають стратегічним цілям і актуальним потребам громадян.

Чому це важливо?

- ▼ Поєднання стратегічного і середньострокового бюджетного планування дозволяє спрямовувати фінансовий ресурс держави на ключові проекти
- ▼ Територіально орієнтований підхід забезпечує врахування потреб регіонів та громад у процесі планування інвестицій
- ▼ Ефективне використання публічних інвестицій – одна з умов сталого економічного зростання, підвищення якості державних послуг і розвитку людського капіталу
- ▼ Інвестиції в економічну та соціальну інфраструктуру сприяють зростанню продуктивності, зменшенню регіональних дисбалансів, посиленню конкурентоспроможності та додаткових робочих місць
- ▼ Впровадження реформи узгоджене зі структурними орієнтирами програм міжнародної фінансової підтримки, зокрема Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу (Ukraine Facility)
- ▼ Реформа створює передумови для прозорого та підзвітного процесу управління публічними інвестиціями на всіх етапах – від планування до реалізації та оцінки

ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКІВ ПІДГОТОВКИ, ОЦІНКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІ, ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ

Заходи щодо реформування УПІ були деталізовані в «Дорожній карті реформування системи управління публічними інвестиціями», яку Уряд України ухвалив у грудні 2023 року. Наступним кроком стало ухвалення плану дій з її реалізації та визначення головними виконавцями Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Міністерство розвитку.

У 2024 році Уряд визначив пріоритети для фінансування публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік, критерії їх відбору та формування Єдиного проєктного портфеля. В ЄПП, який можна переглянути на публічному порталі DREAM, міститься 789 проєктів, з яких 93 проєкти частково або повністю профінансовані з державного бюджету у 2025 році.

Важливі зміни в межах реформи системи УПІ парламент ухвалив 16 січня 2025 року. Зокрема, Законом про внесення змін до Бюджетного кодексу України встановлено зв'язок між системою УПІ та середньостратегічним бюджетним плануванням, яке ґрунтуються на відповідності стратегії розвитку держави.

В документі також визначаються ключові поняття та процедури середньостратегічного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, що здійснюються на державному, регіональному та місцевому рівнях, інтеграцію цих процедур до усіх стадій бюджетного процесу.

Відповідно до Закону, Єдина інформаційна система управління публічними інвестиційними проєктами, складовою якої є DREAM, стає цифровою основою реформи та «банком» ПІПів, сформованих у вигляді пріоритетованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій за результатами їх підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до цих змін, 28 лютого 2025 року Уряд України затвердив ключові нормативно-правові акти, що регламентують кроки реалізації реформи УПІ, а саме:

- ▼ Формування Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій
- ▼ Підготовку інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
- ▼ Оцінку та пріоритезацію
- ▼ Формування секторальних та єдиного портфелів на місцевому, регіональному та державному рівнях
- ▼ Розподіл фінансування
- ▼ Реалізацію та моніторинг ПІПів та програм

Порядки розроблено Мінекономіки у тісній співпраці з Мінфіном, Мінрозвитку та Проектним офісом DREAM за підтримки національних та міжнародних партнерів, включаючи ЄІБ JASPERS, UK IPA, Світовий банк, Open Contracting Partnership, Tony Blair Institute на основі UK 5 Case Model та найкращих практик ЄС.

Ознайомитися з повним переліком нормативно-правових актів, що формують правову основу реформи та регулюють відповідні процеси, можна у Додатку.

ГРАФІК ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ У 2025 РОЦІ

НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

- **Березень-травень 2025** Підготовка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (СПІ)
- **Квітень - червень 2025** Оновлення функціоналу екосистеми DREAM
- **Травень-грудень 2025** Кампанія з підвищення обізнаності щодо реформування УПІ
- **Травень 2025** Затвердження СПІ
- **Червень 2025** Початок підготовки проєктів та програм держави на основі нової методології
- **Липень 2025** Оновлення Єдиного проектного портфеля держави на основі СПІ
- **Грудень 2025** Оновлення секторальних стратегій

НА РІВНІ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ

- **Травень-грудень 2025** Кампанія з підвищення обізнаності щодо реформування УПІ
- **Липень 2025** Початок підготовки місцевих/регіональних СПІ
- **Вересень 2025** Початок підготовки місцевих/регіональних інвестиційних проєктів та програм на основі нової методології
- **Листопад-грудень 2025** Затвердження місцевих/регіональних єдиних проектних портфелів

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для того, щоб забезпечити спроможність виконувати необхідний функціонал та заходи, передбачені реформою УПІ, на державному рівні було утворено:

- ▼ Стратегічну інвестиційну раду під головуванням Прем'єр-міністра України, яка, зокрема, схвалює середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій та єдиний портфель публічних інвестиційних проектів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснює верхньорівневий моніторинг їх реалізації.
- ▼ Міжвідомчу робочу групу з підготовки публічних інвестиційних проектів, як консультативний орган при Кабінеті Міністрів України. Вона виконуватиме роль посередника між системою управління публічними інвестиціями та різними програмами підготовки проектів (PPF).
- ▼ Міжвідомчу комісію з питань розподілу публічних інвестицій, яка займається розподілом коштів на фінансування інвестиційних проектів з держбюджету або з державною підтримкою.

Крім того, передбачено утворення структурних підрозділів з питань управління публічними інвестиціями у центральних органах виконавчої влади.

Зверніть увагу, що **на місцевому та регіональному рівнях** також передбачено:

1. Утворення місцевої інвестиційної ради.
2. Утворення місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій.
3. Утворення структурного підрозділу з питань управління публічними інвестиціями відповідно до Примірних положень на місцевому (ЗРАЗОК) та регіональному рівні (ЗРАЗОК).

ВАЖЛИВО

Для проведення **секторальної експертної оцінки** публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій необхідно визначити:

- **на місцевому рівні** – структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, відповідальний в межах території територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідному секторі;
- **на регіональному рівні** – структурний підрозділ ОДА/ОВА, відповідальний в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної політики у відповідному секторі.

Для проведення **експертної оцінки** із наданням висновків щодо публічних інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, визначити:

- **на місцевому рівні** – визначений органом місцевого самоврядування структурний підрозділ, відповідальний в межах територіальної громади за реалізацію державної інвестиційної, фінансової політики та політики у сфері благоустрою та інфраструктури в межах їх повноважень;
- **на регіональному рівні** – визначений ОДА/ОВА структурний підрозділ, відповідальний в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної інвестиційної, фінансової політики, стратегічного планування та регіонального розвитку в межах їх повноважень.

Врахуйте, що ініціація та підготовка ПІПів та програм передбачає наявність **команди управління проектом**, орієнтовно за такою рольовою моделлю:

- Керівник проекту
- Менеджер проекту
- Інші внутрішні спеціалісти, які залучаються до вирішення специфічних питань і надання консультацій при підготовці ПІП та програм, наприклад: фінансисти, юристи, закупівельники
- Інші зовнішні спеціалісти, радники, які можуть допомагати з питаннями, які неможливо вирішити своїми силами

Після формування управлінської архітектури розпочинається процес визначення пріоритетів і завдань, та робота з підготовки проектних пропозицій.

■ РОЗРОБКА СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУ ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Розробка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) є першочерговим та одним з найважливіших етапів, який закладає основу для якісного планування, ефективної та обґрунтованої підготовки ПІПів та програм, формування секторальних портфелів та ЄПП місцевого та регіонального рівнів.

На місцевому та регіональному рівні розробка СПІ розпочнеться у липні 2025 року.

Першим кроком стане формування відповідних структурних підрозділів та місцевих інвестиційних рад відповідно до затверджених Положень.

Зазначимо, що примірним положенням рекомендується:

- структура та чисельність Підрозділу визначаються відповідно до структури та штатного розпису міської (селищної, сільської) ради, військової адміністрації населеного пункту у разі її утворення
- вид структурного підрозділу (управління, відділ, інший структурний підрозділ) визначається з урахуванням характеру та обсягу роботи
- координує і спрямовує роботу Підрозділу – начальник Підрозділу
- Підрозділ є підзвітним та підконтрольним міській (селищній, сільській) раді, начальнику військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення), підпорядковується виконавчому комітету, голові міської (селищної, сільської) ради, начальнику військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення), іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень

Основний функціонал структурного підрозділу:

- координація формування та подання пропозиції до СПІ
- аналіз реалізації СПІ
- координація формування секторальних проектних портфелів територіальної громади
- участь у проведенні секторальної експертної оцінки та експертної оцінки
- ініціація та підготовка ПІП та Програм

- подання ПІПів та Програм на відбір до ЄПП місцевого та регіонального рівня
- підготовка моніторингового звіту про реалізацію СПІ територіальної громади;
- здійснює подання до місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій для відбору проектів та програм, що потребують співфінансування з державного (обласного) бюджету

Стратегія розвитку громади (регіону) є основною для формування СПІ громади (регіону). В свою чергу, ці стратегії мають відповідати цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку.

Орієнтиром для ОМС в формуванні середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій може бути СПІ держави, сформований Міністерством економіки у **травні 2025 року** на основі пропозицій секторальних міністерств на найближчі три роки.

Середньостроковий план публічних інвестицій громади чи регіону базується на власних стратегіях і буде відрізнятися від СПІ держави. В той же час, важливо усвідомлювати, що кошти державного бюджету будуть виділятися на пріоритетні напрями інвестування, визначені в СПІ держави. Таким чином у разі необхідності залучення державних коштів на проект, що спрямований на реалізацію окремого напряму на рівні громади (регіону), цей напрям має корелюватися з пріоритетним напрямом публічного інвестування держави.

Ознайомитися з деталями пропозицій та затвердженім СПІ держави можна на відповідній сторінці публічного порталу екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM - dream.gov.ua та в модулі аналітики bi.dream.gov.ua.

Розробка СПІ

СПІ регіону або громади розробляється на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, що визначається прогнозом місцевого бюджету (Додаток, Бюджетний кодекс України, Ст. 75-2).

Фінансовий підрозділ на місцевому рівні виділяє граничний обсяг публічних інвестицій, враховуючи Бюджетну декларацію, яка дає загальний обсяг трансферів з державного бюджету в місцевий.

Для визначення граничного сукупного обсягу публічних інвестицій важливо проаналізувати фінансовий ресурс місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік, ухвалений з урахуванням Бюджетної декларації на середньостроковий період.

СПІ мають містити:

1. **підсектори** галузей публічного інвестування;
2. **напрями публічного інвестування** у відповідних галузях з обов'язковим визначенням пріоритетних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями галузевих стратегій, в розрізі сфер державної політики та регіонів;
3. **цільові показники** напряму публічного інвестування, визначені з урахуванням наскрізних стратегічних цілей та узгоджені з показниками виконання завдань, визначених галузевими стратегіями;
4. орієнтовні **фінансові потреби** у здійсненні публічних інвестицій разом з розрахунками, що обґрунтують такі потреби;
5. чіткі та вимірювальні **критерії відповідності** напрямам публічного інвестування у відповідних галузях з урахуванням наскрізних цілей реалізації публічних інвестицій;
6. інформацію у вигляді питань для проведення оцінки проектів та програм та їх потенційного включення до секторальних проектних портфелів.

Затвердження СПІ

СПІ регіону/громади схвалюється місцевою інвестиційною радою і затверджується на рівні регіональних та місцевих органів влади одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету.

Для визначення граничного сукупного обсягу публічних інвестицій важливо проаналізувати фінансовий ресурс місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік, ухвалений з урахуванням Бюджетної декларації на середньостроковий період.

Після затвердження СПІ на місцевому та регіональному рівні, дані додаються в екосистему DREAM.

ФОРМУВАННЯ СПІ



Після того, як буде сформовано і затверджено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, органи влади відповідного рівня можуть переходити до підготовки проєктів і програм.

► ЯК ПІДГОТУВАТИ ПУБЛІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ ТА ПРОГРАМУ

Україна запроваджує нові підходи до підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій. В основі логіки формування ПІПів лежать найкращі світові практики, зокрема, всесвітньо визнана Модель 5 обґрунтувань, розроблена в Великобританії (UK 5 Case Model), міжнародні та українські підходи до розподілу публічних інвестицій, що корелюються з чинним законодавством України.

Звісно, не всі кроки можуть бути реалізовані в українському контексті, тому методологія була адаптована до наших реалій з урахуванням рекомендацій Європейського союзу.

Модель передбачає наявність трьох етапів: попереднього техніко-економічного обґрунтування, повного техніко-економічного обґрунтування та реалізації.

На попередньому та повному ТЕО необхідно опрацювати 5 обґрунтувань, а саме стратегічне, економічне, фінансове, управлінське та комерційне.

Далі детальніше розглянемо основні етапи підготовки ПІПів та програм публічних інвестицій.

Хто може бути ініціатором проєкту?

- органи державної влади (міністерства, ЦОВВ, ОДА/ОВА)
- органи місцевого самоврядування (міські, сільські, селищні, обласні ради)
- державні та комунальні підприємства
- суб'єкти господарювання, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього суб'єкта

Ініціація проектів та програм повинна спрямовуватися на реалізацію стратегічних цілей, шляхом досягнення запланованих показників напрямів публічного інвестування, визначених стратегічними документами та СПІ відповідного рівня.

А отже, на етапі підготовки ПІПів та програм початковим та найважливішим є обґрунтування доцільності їх реалізації, чому проект потрібен і як його можна реалізувати.

Що це означає?

Підготовка ПІП починається з формування ідеї, яка відповідає стратегічним цілям різних рівнів та потребам громадян. Ініціатор проекту має підготувати попереднє ТЕО.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим для всіх проектів на державному, регіональному та місцевому рівні.

Важливо: описане попереднє ТЕО не є тотожним «будівельному ТЕО», яке добре відоме в Україні, хоча і має деякі спільні елементи та схожу назву. Мета попереднього ТЕО – довести стратегічну, економічну, соціальну та інвестиційну доцільність.

На етапі **Стратегічного обґрунтування** необхідно проаналізувати проблематику проекту, вивчити попит, сформулювати мету та цілі проекту відповідно до стратегічно-планувальних документів.

На етапі **Економічного обґрунтування** необхідно провести соціально-економічний аналіз, сформувати показники проекту, розглянути альтернативні технічні рішення.

На етапі **Фінансового обґрунтування** має бути сплановано бюджет проекту, сформовані статті витрат та проаналізовані можливі джерела фінансування.

На етапі **Комерційного обґрунтування** необхідно проаналізувати ринок постачальників, спланувати закупівлі, визначити закупівельні ризики.

На етапі **Управлінського обґрунтування** необхідно підготувати план реалізації проекту, проаналізувати компетенції команди та сформувати

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ

Опис загальної характеристики проекту, що включає:

- назуву
- короткий опис
- унікальний ідентифікатор
- найменування ініціатора
- Найменування головного розпорядника коштів
- мету
- місце реалізації
- загальну вартість
- підтвержене фінансування
- період реалізації



Розробка попереднього ТЕО/повного ТЕО проекту з урахуванням стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування



Автоматичний скринінг проекту засобами DREAM



Подання проекту для проведення секторальної оцінки та включення до секторального проектного портфеля держави (регіону, громади)

* Для підготовки проектів державно-приватного партнерства (ДПП) застосовується окрема процедура

ПОПЕРЕДНЄ ТЕО

Попереднє ТЕО* на державному, регіональному, місцевому рівнях передбачає внесення в DREAM інформації про проект за результатами опрацювання:

1. Стратегічного обґрунтування

- аналіз відповідності стратегії
- визначення напряму публічного інвестування
- аналіз потреби
- підтвердження відповідності мети проекту напряму публічного інвестування
- забезпечення відповідності цільовим показникам та наскрізним стратгіям
- визначення поточної ситуації
- визначення бенефіціарів та вигод
- аналіз проекту на відповідність ЦСР

2. Економічного обґрунтування

- проведення аналізу можливих технічних рішень
- визначення попереднього технічного рішення
- визначення соціально-економічного ефекту
- проведення базового аналізу впливу на навколошнє середовище та зміну клімату

3. Комерційного обґрунтування

- проведення попередньої оцінки ринку постачальників та підрядників
- проведення аналізу доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень

4. Фінансового обґрунтування

- визначення обсягів витрат (капітальних та операційних)
- формування детального бюджету
- розгляд потенційних джерел фінансування та фондування
- аналіз отримання доходу (якщо передбачається)
- аналіз доступності послуг для споживачів

5. Управлінського обґрунтування

- проведення аналізу необхідних ролей та компетенцій для успішної підготовки та реалізації
- підготовка плану реалізації з визначенням послідовності дій та

*Попереднє техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим для всіх проектів на державному, регіональному, місцевому рівнях.

Після формування попереднього техніко-економічного обґрунтування ініціатор ПІП має внести ці дані в DREAM, попередньо підготувавши короткий опис проекту (назву, мету, дані щодо ініціатора та ГРК, місце реалізації тощо).

В DREAM відбувається автоматичний скринінг проекту, який визначає його відповідність критеріям обраного напряму публічного інвестування. Після цього проект направляється на секторальну оцінку з можливістю подальшого включення до секторального портфеля та ЄПП місцевого чи регіонального рівня.

Для проектів, вартістю понад 50 мільйонів гривень, які претендують на фінансування з держбюджету, повинно бути розроблене повне ТЕО, яке враховує стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування.

ПОВНЕ ТЕО

Повне ТЕО* відбувається шляхом внесення в DREAM інформації про проект за результатами детального опрацювання:

1. Стратегічного обґрунтування:

- перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту відповідно до попереднього ТЕО

2. Економічного обґрунтування:

- визначення фінального технічного рішення
- Проведення економічного аналізу
- проведення оцінки впливу на довкілля та соціальну сферу
- проведення аналізу впливу на довкілля та зміну клімату
- підтвердження соціально-економічного ефекту
- проведення аналізу чутливості до змін основних параметрів

3. Комерційного обґрунтування

- визначення та обґрунтування стратегії закупівель
- проведення попереднього залучення ринку

4. Фінансового обґрунтування

- формування детального бюджету проекту
- уточнення потенційних джерел фінансування
- проведення фінансового аналізу
- визначення ризиків
- проведення якісної та кількісної оцінки придатності проекту для ДПП

5. Управлінського обґрунтування

- формування команди управління проектом
- розробка плану залучення зацікавлених сторін
- фіксація результатів проведеної роботи

***Повне техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим для проектів з прогнозованою загальною вартістю > 50 млн грн, крім ДПП**

На місцевому та регіональному рівнях може бути сформована програма публічних інвестицій. Програма - це свого роду агрегація ПІПів для реалізації однієї мети.

Проекти можуть бути включені у програму за умови їх відповідності вимогам та критеріям програми, визначених ініціатором програми.

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМИ

Підготовка програми: опис загальної характеристики з урахуванням стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування



Автоматичний скринінг на відповідність критеріям обраного напряму публічного інвестування



Подання програми для проведення секторальної оцінки



У разі позитивної оцінки - включення до секторального проектного портфеля держави (регіону, громади)

У разі негативної оцінки програма відправляється на доопрацювання та може бути подана повторно

*Виключно програми, включені до ЄПП держави (регіону, громади), можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації коштом

Ініціатор програми розробляє її та вносить в DREAM на підставі попередньо проведеного обґрунтування за такими критеріями:

1. Стратегічне обґрунтування:

- визначення мети
- визначення завдань та цілей
- формування показників
- опис проблеми
- забезпечення відповідності програми наскрізним стратгіям
- аналіз програми на відповідність цілям сталого розвитку

2. Економічне обґрунтування:

- проведення аналізу економічної доцільності
- проведення фінансово-економічних розрахунків
- визначення потенційних ризиків

3. Фінансове обґрунтування:

- визначення обсягів та напрямів фінансування
- визначення потенційних джерел фінансування
- проведення аналізу фінансової стійкості
- визначення ризиків

4. Управлінське обґрунтування:

- формування критеріїв включення проєктів до програми та їх пріоритетизації
- проведення аналізу наявності або відсутності у DREAM проєктів у відповідному секторі
- розробка плану реалізації

Всі проєкти та програми внесені до державної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями DREAM підлягають обов'язковій оцінці.

ОЦІНКА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ

Оцінка проектів та програм на етапі підготовки на державному, регіональному та місцевому рівнях включає скринінг, секторальну експертну оцінку та експертну оцінку.

- Скринінг - попередній етап оцінки на відповідність критеріям напряму публічного інвестування, здійснюється автоматично засобами DREAM
- Секторальну експертну оцінку - перевірку структурними підрозділами/органами, відповідальними за реалізацію державної політики у відповідному секторі, стратегічного, економічного, фінансового, управлінського та комерційного обґрунтування
- Експертну оцінку - перевірку структурними підрозділами/органами, відповідальними за реалізацію державної інвестиційної політики, стратегічного, економічного, фінансового, управлінського та комерційного обґрунтування

Формування висновків проведеної оцінки відбувається шляхом заповнення чек-листів в DREAM уповноваженими особами відповідних структурних підрозділів ОМС, ОДА/ОВА, міністерств.

У разі негативної оцінки проект відправляється на доопрацювання та може бути поданий ініціатором повторно.

Ti проекти та програми, які успішно пройшли перевірку та секторальну експертну оцінку, додаються в секторальний портфель відповідного рівня, а після експертної оцінки - в ЄПП місцевого, регіонального або державного рівня.



ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ ПУБЛІЧНИХ

Етапи оцінки (скрінінгу)	Оцінка відповідності (скрінінг) в DREAM	Секторальна оцінка в DREAM	Експертна оцінка в DREAM	Проект, що включено до секторального проектного портфеля держави (регіону, громади) після проведення експертної оцінки відповідного рівня може бути включений до Единого проектного портфеля публічних інвестицій держави, регіону, громади
Принципи оцінки (скрінінгу)	Попередній етап оцінки, що здійснюється автоматично	Перевірка стратегічного, економічного управлінського, фінансового обґрунтувань, а для проектів ще додаткового комерційного обґрунтування		
Державний рівень	Здійснюється за допомогою програмних засобів DREAM	Відповідальне за сектор Міністерство	Мінекономіки, Мінфін, Мінрозвитку та Міндовкілля відповідно до їх повноважень	Проект Единого проектного портфеля публічних інвестицій держави формує Мінекономіки, для рівня - відповідний структурний підрозділ ОДА/ОВА чи ОМС
Регіональний рівень	Здійснюється за допомогою програмних засобів DREAM	Структурні підрозділи ОДА/ОВА	Структурні підрозділи ОМС	
Місцевий рівень	Здійснюється за допомогою програмних засобів DREAM	Структурні підрозділи ОМС		
Можливі рішення та результат проведення оцінки	Подальше проходження на секторальну оцінку Відхилення та нова подача	Включення до секторального проектного портфеля на відповідному рівні	Формування висновку та можливості подальшого включення проекту/програми до проекту Единого портфеля держави, регіону, громади	
		Направлення на доопрацювання	Направлення на розвідність проекта/програми стратегічним документам	
		Відхилення у разі невідповідності проекта/програми стратегічним документам		

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ПРОЄКТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ І СЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЄКТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ГРОМАДИ

Логіка формування секторального проектного портфеля

Секторальні проектні портфелі складаються з проектів та програм, які є важливими в розрізі відповідного сектору та відповідають усім напрямам секторальної стратегії, як пріоритетним, так і непріоритетним.

Важливо зазначити, що секторальні портфелі формуються на постійній основі, відповідно до появи нових проектів і програм.

Проте, в Єдиний проектний портфель надалі можуть бути спрямовані тільки ті проекти з секторального портфеля, що реалізуються в межах пріоритетного напряму.

При цьому, якщо проект чи програма не пройшли відбір у секторальний портфель, то фінансування з залученням публічних коштів для них неможливе.


СЕКТОРАЛЬНИЙ ПРОЄКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ



- Секторальний проектний портфель створюється, формується, наповнюється, ведеться та оновлюються з використанням екосистеми DREAM
- Секторальна експертна оцінка проводиться регулярно, але не рідше, ніж 1 раз на квартал
- Секторальні проектні портфелі агрегують проекти та формують цілісну картину про загальний стан та потребу сектору


ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ПРОЄКТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Єдиний проектний портфель (ЄПП) складається з проектів та програм, які потрапили в секторальний портфель, пройшли експертну оцінку та пріоритезацію, були схвалені місцевою інвестиційною радою (Стратегічною радою - на рівні держави), і визначені як такі, що можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх підготовки та реалізації.

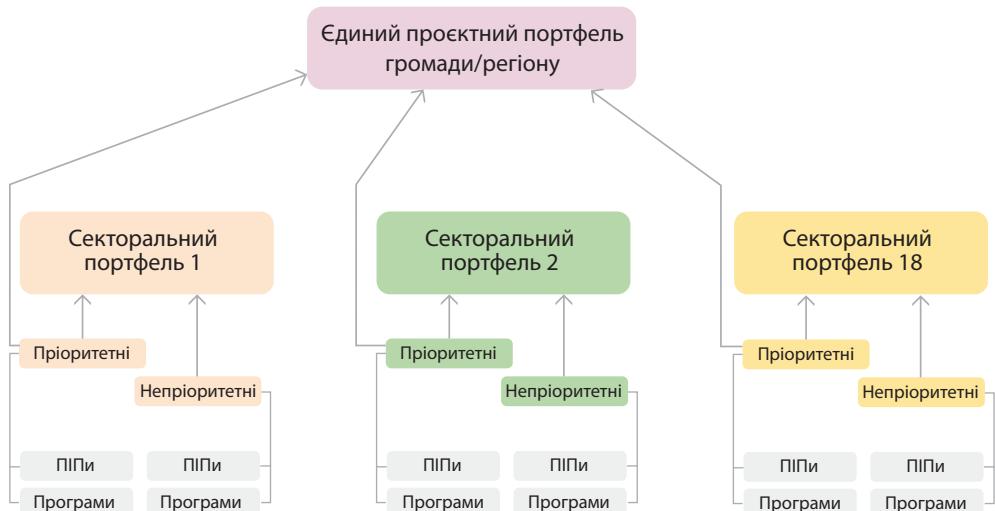

- ЄПП створюється, формується, наповнюється, ведеться та оновлюються з використанням екосистеми DREAM
- В ЄПП можуть потрапити проекти та програми виключно, якщо вони відповідають пріоритетним напрямам інвестування
- В ЄПП потрапляють виключно за поданням відповідного секторального підрозділу/міністерства

ЄДИНІЙ ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

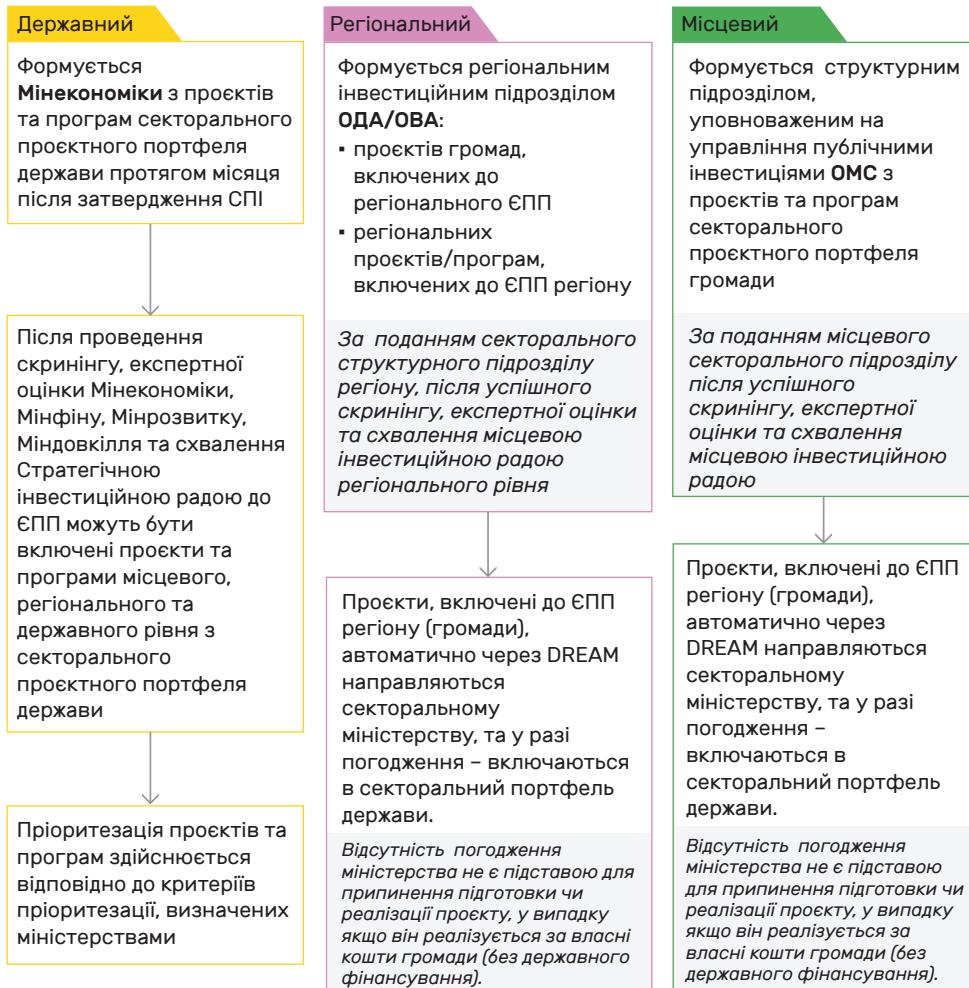

Проекти, включенні до ЄПП регіону (громади), автоматично через DREAM направляються секторальному міністерству, та у разі погодження – включаються в секторальний портфель держави.

Відсутність погодження міністерства не є підставою для припинення підготовки чи реалізації проекту, у випадку якщо він реалізується за власні кошти громади (без державного фінансування).

Лише проекти, що включені в місцевий або регіональний ЄПП, мають право на фінансування з відповідного бюджету.

Якщо на проект потрібно залучити кошти з державного бюджету – проекти з місцевого та регіонального ЄПП мають потрапити в ЄПП держави.

Для цього вони мають пройти оцінку відповідного секторального міністерства та потрапити в секторальний портфель держави, а далі – за рішенням секторального міністерства – можуть бути направлені на експертну оцінку для включення в ЄПП.

Фінансування з державного бюджету розглядається тільки для тих проектів та програм, які знаходяться в державному ЄПП.

ПІП може потрапити в ЄПП держави як напряму після проходження експертної оцінки, так і через програму, ініційовану відповідним секторальним міністерством.

Програма агрегує ПІПи для реалізації однієї мети. За умови, що програма пройшла відповідну експертну оцінку та потрапила в ЄПП держави, проекти, що входять до її складу, не потребують додаткової оцінки.

Відбір проектів в ЄПП відбувається один раз на рік.

Претендувати на державне фінансування можуть лише ті проекти та програми, які пройшли відбір в ЄПП держави.



КРИТЕРІЇ, ЯКІ ВАЖЛИВО ВРАХУВАТИ

- ▼ Проект вартістю < 50 млн грн, який не потребує держфінансування, може реалізуватися коштом регіону/громади без включення до секторального портфеля чи ЄПП держави.
Але він має бути включений в ЄПП регіону/ громади
- ▼ Проект вартістю < 50 млн грн, який потребує держфінансування, може бути реалізовано після його включення до ЄПП держави і позитивного рішення щодо фінансування, крім проектів ДПП.
- ▼ Проект вартістю > 50 млн грн, який не потребує держфінансування, для підготовки повного ТЕО та реалізації, може розпочати підготовку повного ТЕО без обов'язкового включення в ЄПП держави.
- ▼ Проект вартістю > 50 млн грн, який не потребує держфінансування на підготовку повного ТЕО, але потребує коштів на реалізацію, обов'язково повинен пройти оцінку секторальним міністерством. При цьому, його включення до ЄПП держави не є обов'язковим на етапі підготовки.
- ▼ Проект вартістю < 50 млн грн, який включено в ЄПП регіону/громади та він потребує держфінансування для підготовки повного ТЕО, має бути обов'язково включений до ЄПП держави.

Виключення проектів/програм із секторального проектного портфеля держави, регіону чи територіальної громади і Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій здійснюється структурним підрозділом/органом, відповідальним за формування такого портфеля, за результатами оцінки ефективності реалізації проекту/програми, а також під час оновлення та перегляду секторального проектного портфеля і Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, регіону, територіальної громади на підставі:

- невідповідності визначеним цілям та пріоритетам програмних документів, документів стратегічного планування;
- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які роблять проект недоцільним, у зв'язку зі збільшенням ризиків для подальшої його реалізації;
- порушень в дотриманні строків реалізації заходів проекту/програми;
- внесення недостовірної інформації щодо проекту/програми.

Оновлення та перегляд секторального проектного портфеля і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, регіону, територіальної громади здійснюється структурним підрозділом/органом, відповідальним за формування такого портфеля регулярно, але не рідше, ніж один раз на квартал.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ

Проекти та програми, які включені до ЄПП відповідного рівня, реалізуються за процедурою, визначеною Порядком. Ця процедура є обов'язковою для тих проєктів і програм, що фінансуються з державного бюджету.

Реалізація ПІПів включає розроблення та затвердження проектної документації, отримання дозволів, проведення закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління здійсненням заходів проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію.

Реалізація програм передбачає відбір ПІПів, що відповідають критеріям програми, розподіл публічних коштів, передбачених в межах програми, та моніторинг їх реалізації.

На всіх етапах реалізації проєктів і програм виконавці повинні вносити в DREAM інформацію та супровідні документи щодо прогресу.

Після того, як проєкт пройшов попередні етапи та підтверджена його готовність до реалізації, **Ініціатор зобов'язаний**:

- протягом 10 днів визначити виконавця
- оновлювати інформацію, що може вплинути на реалізацію (обсяги і терміни робіт, бюджет) проєкту
- забезпечувати оцінку ефективності реалізації проєкту
- вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану
- забезпечити дотримання чинних норм і стандартів відповідно до законодавства України

Зауважимо, що виконавцями програми/проєкту можуть бути визначені ініціатором органи державної влади, ОМС, державні чи комунальні підприємства, установи та організації, які відповідно забезпечують і координують виконання програм публічних інвестицій, та реалізацію проєктів (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, виконання та організацію будівельних робіт, прийняття в експлуатацію тощо).

Виконавець зобов'язаний:

- протягом місяця актуалізувати план реалізації проєкту з чітким графіком, датами (формується в DREAM)
- забезпечити якісне і своєчасне виконання всіх заходів плану
- за необхідності, вносити зміни до плану
- щомісяця вносити в DREAM звіти щодо прогресу виконання

Додаток

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ПРАВОВУ ОСНОВУ

- ▼ [Бюджетний кодекс України](#) (зокрема, стаття 75-2, яка регламентує планування, підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на регіональному та місцевому



- ▼ [Закон України «Про інвестиційну діяльність»](#)

- ▼ [Закон України «Про державно-приватне партнерство»](#)



- ▼ [Закон України «Про засади державної регіональної політики»](#)

- ▼ [Постанова КМУ «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» від 13 серпня 2024 р., №940](#)



- ▼ [Постанова КМУ «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради» від 14 травня 2024 року № 549](#)

▼ [Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави» від 28 лютого 2025 р. № 294](#)



▼ [Постанова КМУ «Деякі питання управління публічними інвестиціями» від 28 лютого 2025 р. № 527, якою затверджені Порядки](#)

- підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
- оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
- формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади)
- реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні

▼ Постанова КМУ від 28 лютого № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», якою затверджені

- [Положення про Міжвідомчу комісію з питань розподілу публічних інвестицій](#)



- [Порядок розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій](#)

▼ [Дорожня карта реформування управління публічними інвестиціями](#)





► [План заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки, затверджений розпорядженням КМУ від 18 червня 2024 р. № 588-р.](#)

► ПАРТНЕРИ РОЗРОБКИ ТА ПІДГОТОВКИ ПОРЯДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ УПІ



Міністерство розвитку
громад та територій
України



Міністерство
фінансів
України



Цей матеріал створений за фінансової підтримки Програми допомоги з міжнародного розвитку від Уряду Великої Британії. Зміст є винятковою відповідальністю Проектного офісу DREAM; висловлені погляди не обов'язково відображають офіційну політику Уряду Великої Британії.
